

ANTONIO A. MALAGUTTI

PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS

2008 ~ 2026

1. GOVERNANÇA, FRAMEWORKS METODOLÓGICOS E PROCESSOS

CASE #1

METODOLOGIAS ÁGEIS E HÍBRIDAS

Kroton-Cogna / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de Scrum, Kanban e SAFe (Scaled Agile Framework) para escalar a agilidade em grandes organizações.

SITUAÇÃO

A empresa possuía times isolados com entregas atrasadas e falta de sincronia entre os departamentos.

TAREFA

Escalar a agilidade para alinhar mais de 50 desenvolvedores e garantir a sincronia das entregas.

AÇÃO

Implementação do framework SAFe, desenho da estrutura de trens (ARTs), facilitação de PIs e treinamento de lideranças.

RESULTADO

Sincronização entre departamentos, redução no tempo de entrega e cultura de colaboração instalada.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução do Lead Time de entrega

Aumento no Throughput dos times

ARQUITETURA TÉCNICA

Ferramentas de ALM (Jira/Azure DevOps)

Mapeamento de dependências técnicas inter-squads

GOVERNANÇA

Ritos de Program Increment (PI) Planning

Sincronização de Trens (ARTs) e System Demos

CONTEXTO (DESAFIO)

Estruturação de um escritório de projetos focado em governança, padronização e reporte executivo.

SITUAÇÃO

O banco enfrentava falta de visibilidade sobre o status real dos projetos globais.

TAREFA

Criar uma estrutura de PMO centralizada para garantir governança e padronização.

AÇÃO

Estabelecimento de processos de reporte semanal, padronização de ferramentas e criação de KPIs (CPI e SPI).

RESULTADO

Maior transparência para a diretoria, previsibilidade financeira e redução em retrabalhos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Acuracidade orçamentária global

Redução do desvio de cronograma

ARQUITETURA TÉCNICA

Sistemas integrados de PPM (Project Portfolio Management)

Dashboards analíticos corporativos

GOVERNANÇA

Análise de valor agregado através de CPI e SPI

Reporte executivo semanal para a diretoria internacional

CASE #3**GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS**

Itaú Unibanco / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Alinhamento estratégico entre as iniciativas de TI e os objetivos de negócio da organização.

SITUAÇÃO

Excesso de projetos iniciando sem uma análise clara de valor.

TAREFA

Implementar Lean Portfolio Management para alinhar execução técnica à estratégia.

AÇÃO

Priorização baseada em WSJF e estabelecimento de ritos de revisão de portfólio trimestrais.

RESULTADO

Foco total nas iniciativas de maior ROI e descontinuidade de projetos de baixo valor.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Retorno sobre o Investimento (ROI) do portfólio

Taxa de eficiência na alocação de Capex

ARQUITETURA TÉCNICA

Modelagem de capacidade de engenharia de TI

Matriz de dependências de sistemas legados

GOVERNANÇA

Lean Portfolio Management (LPM)

Priorização estratégica via WSJF (Weighted Shortest Job First)

CASE #4**GESTÃO DE CULTURA E MUDANÇA ORGANIZACIONAL**

Kroton-Cogna / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Facilitação da transição cultural em momentos de mudança de processos ou fusões.

SITUAÇÃO

Resistência alta à nova metodologia ágil no nível gerencial.

TAREFA

Facilitar a transição cultural e reduzir a resistência a novos processos.

AÇÃO

Aplicação do modelo ADKAR, workshops de alinhamento e rede de Agentes de Mudança.

RESULTADO

Redução da resistência e adoção acelerada dos novos processos de trabalho.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Índice de adoção de novas ferramentas de trabalho

Redução do turnover em períodos de transição estrutural

ARQUITETURA TÉCNICA

Plataformas corporativas de comunicação e treinamento

Mapeamento analítico de engajamento interno

GOVERNANÇA

Framework de gestão de mudança ADKAR

Fóruns periódicos com a rede de Agentes de Mudança

CONTEXTO (DESAFIO)

Aplicação de princípios Lean para reduzir desperdícios e otimizar o fluxo de entrega.

SITUAÇÃO

Fluxo de desenvolvimento repleto de gargalos e esperas desnecessárias.

TAREFA

Reduzir desperdícios e otimizar o fluxo de entrega.

AÇÃO

Mapeamento de fluxo de valor (VSM) e integração de etapas burocráticas redundantes.

RESULTADO

Redução de 15% nos custos operacionais e melhoria no Cycle Time.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 15% nos custos operacionais

Otimização do Cycle Time de entrega

ARQUITETURA TÉCNICA

Mapeamento analítico do fluxo operacional de software

Sistemas de automação de fluxo de aprovações

GOVERNANÇA

Mapeamento de Fluxo de Valor (Value Stream Mapping - VSM)

Eliminação de desperdícios no pipeline de demandas

CONTEXTO (DESAFIO)

Transição de modelos tradicionais para ágeis em toda a organização.

SITUAÇÃO

Empresa desejava mudar para o ágil, mas sem saber por onde começar.

TAREFA

Liderar a transição de modelos tradicionais para ágeis.

AÇÃO

Início por projeto piloto, Agile Coaching para times e mentoria executiva.

RESULTADO

Transformação bem-sucedida da unidade de negócio operando sob princípios ágeis.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Melhoria na velocidade de lançamento de produtos (Time-to-Market)

Aumento no índice de satisfação do cliente final

ARQUITETURA TÉCNICA

Migração de infraestrutura organizacional para squads autônomas

Arquitetura de ferramentas de colaboração conectadas

GOVERNANÇA

Comitê central de transformação ágil

Mentoria e alinhamento executivo contínuo

CONTEXTO (DESAFIO)

Unificação de três sistemas legados em uma plataforma única de operações, lidando com o desalinhamento de prioridades de uma equipe de 25 profissionais de diferentes especialidades.

SITUAÇÃO

Desalinhamento de prioridades entre silos de uma equipe multidisciplinar (engenheiros de dados, especialistas em UX e analistas de negócios) no processo de modernização de sistemas legados.

TAREFA

Unificar três sistemas legados em uma plataforma única de operações, garantindo a coesão das entregas e mitigando riscos técnicos.

AÇÃO

Implementação de uma esteira de valor baseada em OKRs compartilhados, desenho da matriz de governança e atuação direta com os tech leads para mitigação de riscos de arquitetura.

RESULTADO

Redução do Time-to-Market de novos recursos em 35% e economia de custos operacionais de USD 1.2 milhão no primeiro ano.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 35% no Time-to-Market

Economia operacional de USD 1.2 milhão no primeiro ano

ARQUITETURA TÉCNICA

Plataforma integrada de operações

Modernização e consolidação de arquiteturas legadas para sistemas unificados

GOVERNANÇA

Esteira de valor baseada em OKRs compartilhados

Matriz de governança multidisciplinar integrada com os tech leads

2. GESTÃO DE PESSOAS, DINÂMICAS DE TIME E LIDERANÇA

CASE #8 LIDERANÇA DE TIMES REMOTOS E GLOBAIS

Grupo Boticário / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Coordenação de equipes distribuídas geograficamente, garantindo produtividade e engajamento.

SITUAÇÃO

Time sofrendo com a falta de coesão devido à distância física.

TAREFA

Manter a produtividade e o engajamento de um time distribuído geograficamente.

AÇÃO

Criação de rituais de check-in, dailies assíncronas e quadros virtuais para transparência.

RESULTADO

Manutenção do alto engajamento e entregas pontuais com time 100% remoto.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Pontualidade nas entregas remotas

Índice de engajamento do time (eNPS)

ARQUITETURA TÉCNICA

Ambientes de trabalho virtuais baseados em nuvem

Ferramentas assíncronas de comunicação distribuída

GOVERNANÇA

Rituais de check-in estruturados

Quadros virtuais de transparência operacional para visibilidade contínua

CONTEXTO (DESAFIO)

Mediação de atritos entre membros da equipe, transformando crises em oportunidades de melhoria.

SITUAÇÃO

Conflito latente entre desenvolvimento e QA que travava as entregas.

TAREFA

Transformar a crise em oportunidade e garantir a qualidade do produto.

AÇÃO

Sessões de mediação, dinâmicas de segurança psicológica e metas de qualidade compartilhadas.

RESULTADO

Ambiente de trabalho saudável e redução drástica na densidade de bugs.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução drástica na densidade de bugs pós-entrega

Estabilização no ritmo de entregas das Sprints

ARQUITETURA TÉCNICA

Ambiente integrado de DevOps ligando ferramentas de desenvolvimento e teste

Automação de relatórios de QA

GOVERNANÇA

Sessões formais de mediação e dinâmicas de segurança psicológica

Metas de qualidade técnica compartilhadas entre Engenharia e QA

CONTEXTO (DESAFIO)

Identificação e desenvolvimento de novos líderes dentro da organização.

SITUAÇÃO

Necessidade de escalar times e escassez de lideranças técnicas preparadas.

TAREFA

Desenvolver novos líderes técnicos com visão de negócio e gestão.

AÇÃO

Programa de mentoria focado em Soft Skills, Gestão Estratégica e Liderança Situacional.

RESULTADO

Promoção de três novos Tech Leads gerenciando squads com sucesso.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Capacidade de escalabilidade dos times internos

Retenção de talentos técnicos de alta senioridade

ARQUITETURA TÉCNICA

Mapeamento de competências e matriz de habilidades (Skills Matrix)

Estrutura organizacional de liderança descentralizada

GOVERNANÇA

Programa estruturado de mentoria em liderança situacional

Avaliação periódica de maturidade de gestão dos novos Tech Leads

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de um ambiente que estimule a alta performance e o bem-estar do time.

SITUAÇÃO

Time desmotivado por prazos agressivos e falta de reconhecimento.

TAREFA

Estimular a alta performance e o bem-estar da equipe.

AÇÃO

Sistema de metas claras, rituais de celebração e autonomia técnica.

RESULTADO

Aumento significativo na produtividade e queda no turnover.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Aumento de produtividade operacional

Queda no índice de turnover (rotatividade de colaboradores)

ARQUITETURA TÉCNICA

Métricas analíticas de carga de trabalho por sprint

Sistemas internos de feedback contínuo e reconhecimento

GOVERNANÇA

Definição de metas de performance transparentes

Rituais de celebração e concessão de autonomia técnica regulada

CONTEXTO (DESAFIO)

Aplicação de princípios de liderança baseados na autonomia, resiliência e autogestão.

SITUAÇÃO

Lideranças perdendo o foco e calma em ambientes de alta pressão.

TAREFA

Aplicar princípios de autonomia, resiliência e autogestão na liderança.

AÇÃO

Treinamento em Dicotomia do Controle e objetividade absoluta (Estoicismo).

RESULTADO

Redução no estresse da gerência e tomada de decisão rápida e racional.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução no tempo de resposta a incidentes críticos

Estabilidade operacional das gerências sob forte pressão

ARQUITETURA TÉCNICA

Modelos analíticos de árvore de decisão para cenários de crise

Mapeamento de resiliência corporativa

GOVERNANÇA

Framework de liderança soberana baseada em Stoic philosophy

Ritos de análise racional baseados na Dicotomia do Controle

 3. GESTÃO DE RISCOS, CRISES E RECUPERAÇÃO DE PROJETOS (TURNAROUND)

CASE #13

GESTÃO DE RISCOS E INCERTEZAS

Bradesco / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Identificação proativa e mitigação de riscos que podem comprometer o projeto.

SITUAÇÃO

Migração de dados crítica com alta probabilidade de falha técnica.

TAREFA

Mitigar riscos proativamente para garantir o sucesso do projeto.

AÇÃO

Matriz de riscos dinâmica, planos de contingência e PoCs técnicas.

RESULTADO

Antecipação de três problemas graves resolvidos antes do impacto no cronograma.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

- Zero interrupção em serviços críticos de produção
- Prevenção de custos imprevistos por quebra de cronograma

ARQUITETURA TÉCNICA

- PoCs (Prova de Conceito) de migração isoladas em sandbox
- Arquitetura de Rollback automatizada

GOVERNANÇA

- Matriz de riscos dinâmica e viva (FMEA / Curva de Probabilidade)
- Acompanhamento em comitê técnico preventivo

CONTEXTO (DESAFIO)

Atuação decisiva em situações de emergência, garantindo a continuidade e a entrega.

SITUAÇÃO

Projeto estratégico parado por questões técnicas complexas.

TAREFA

Garantir a continuidade e a entrega em situação de emergência.

AÇÃO

Liderança direta via war room, foco no MVP crítico e renegociação de expectativas.

RESULTADO

Entrega no prazo regulatório e estabilização total pós-crise.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Adesão a prazos contratuais regulatórios

Minimização de perdas por indisponibilidade de projeto

ARQUITETURA TÉCNICA

Isolamento do escopo técnico do MVP em microserviços estáveis


Diagnóstico emergencial de gargalos de código

GOVERNANÇA

Instalação de War Room diário liderado pelo gestor de projetos

Processo formal de renegociação de escopo com alta gerência

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS

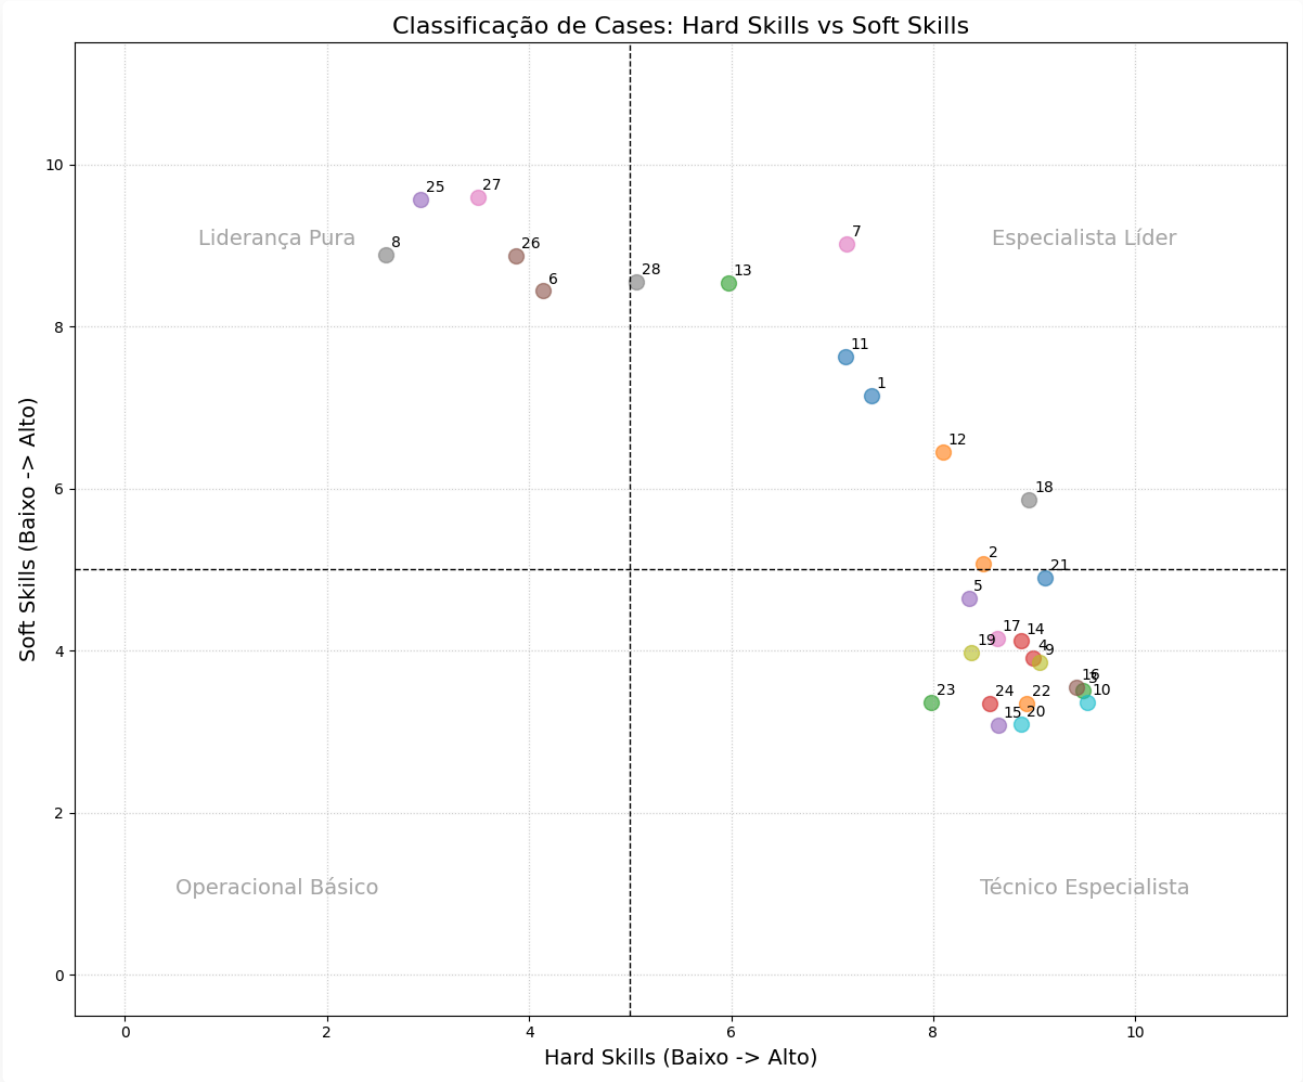

Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

CONTEXTO (DESAFIO)

Reversão de resultados negativos em projetos que estavam fora de controle.

SITUAÇÃO

Projeto com orçamento estourado e atraso de seis meses.

TAREFA

Reverter resultados negativos e retomar o controle do projeto.

AÇÃO

Diagnóstico profundo, reset da governança e redução de escopo ao essencial.

RESULTADO

Entrega bem-sucedida do novo escopo e recuperação da confiança do cliente.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Estabilização financeira pós-estouro

Retomada do índice de confiança do cliente (NPS)

ARQUITETURA TÉCNICA

Congelamento temporário de novas alterações de arquitetura

Auditoria de infraestrutura técnica e de código

GOVERNANÇA

Reset completo do modelo de governança anterior

Redução forçada de escopo atrelada a checkpoints semanais rígidos

CONTEXTO (DESAFIO)

Coordenação proativa de riscos de infraestrutura de alta performance e conformidade legal em um projeto de implementação de IA proprietária.

SITUAÇÃO

Gargalos potenciais no cronograma causados pela dependência crítica do provisionamento de instâncias de GPU em nuvem e pela liberação de licenças jurídicas de conformidade de dados.

TAREFA

Garantir o cumprimento rigoroso dos prazos do projeto e mitigar os riscos de atraso na integração das dependências de terceiros.

AÇÃO

Utilização do mapeamento do Caminho Crítico (CPM) no cronograma, creation de plano de mitigação com fornecedor secundário (fallback de arquitetura aberta) e antecipação dos processos de procurement e homologação jurídica em 30 dias antes do desenvolvimento.

RESULTADO

Integração de 100% das dependências na data de congelamento de código (code freeze), garantindo a entrega do projeto rigorosamente no prazo (on-time delivery) e eliminação de riscos de multas contratuais por atraso.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

100% de On-Time Delivery no prazo final

Eliminação total de penalidades financeiras e multas por atraso

ARQUITETURA TÉCNICA

Estratégia multicloud para processamento de alta performance

Arquitetura aberta baseada em microsserviços desacoplados para fallback técnico

GOVERNANÇA

Gestão proativa baseada no Método do Caminho Crítico (CPM)

Aceleração de ciclos de homologação legal e processos de procurement

4. FINANÇAS, FINOPS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

CASE #17 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (CAPEX/OPEX)

Grupo Globo

CONTEXTO (DESAFIO)

Controle rigoroso dos recursos financeiros do projeto, garantindo a saúde econômica.

SITUAÇÃO

Falta de controle entre investimento (Capex) e custo operacional (Opex).

TAREFA

Garantir a saúde econômica do projeto através de controle rigoroso.

AÇÃO

Modelo de gestão financeira detalhado, práticas de Cloud Finops e ajustes mensais.

RESULTADO

Entrega do projeto 5% abaixo do orçamento previsto inicialmente.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Projeto entregue 5% abaixo da estimativa inicial

Otimização do balanço financeiro corporativo

ARQUITETURA TÉCNICA

Sistemas integrados de faturamento e custos de TI

Instalação de ferramentas de monitoramento de custos em nuvem

GOVERNANÇA

Controle rigoroso de alocação de Capex e Opex

Alinhamento com princípios de governança financeira em Cloud (FinOps)

CONTEXTO (DESAFIO)

Migração e otimização de infraestrutura para ambientes de nuvem (AWS/GCP/Azure).

SITUAÇÃO

Custos com nuvem descontrolados e sem governança.

TAREFA

Migrar e otimizar a infraestrutura para ambientes de nuvem.

AÇÃO

Implementação de práticas de FinOps e redesenho de arquitetura eficiente.

RESULTADO

Redução imediata de 28% na fatura mensal de nuvem.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução recorrente de 28% nos custos com nuvem pública

ARQUITETURA TÉCNICA

Arquitetura de nuvem híbrida/multicloud (AWS/GCP/Azure)

Implementação de auto-scaling e redimensionamento de recursos (Right-sizing)

GOVERNANÇA

Políticas e práticas institucionalizadas de FinOps

Revisões arquiteturais periódicas baseadas em eficiência de custo

CONTEXTO (DESAFIO)

Blindar financeiramente o projeto e conter a expansão de escopo (scope creep) decorrente do refinamento contínuo de modelos de inteligência artificial.

SITUAÇÃO

Risco de estouro orçamentário e desalinhamento financeiro devido à natureza iterativa e potencialmente infinita do refinamento de algoritmos de busca preditiva.

TAREFA

Implementar mecanismos rígidos de controle financeiro e governança de mudanças de escopo em projetos de alta senioridade e complexidade técnica.

AÇÃO

Estabelecimento de uma linha de base de custo (Baseline) atrelada a critérios de Definição de Pronto (DoD) por performance técnica (precisão de 85%) e instituição de um comitê de governança financeira semanal com análise de impacto em cascata no Burn Rate.

RESULTADO

Manutenção do desvio orçamentário abaixo de 2% (dentro da margem de contingência) e preservação da margem de lucro do projeto de serviços profissionais em 22%.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Desvio de orçamento final inferior a 2%

Margem de lucro do projeto estabilizada e preservada em 22%

ARQUITETURA TÉCNICA

Pipelines de treinamento de algoritmos de busca preditiva com limites de carga

Arquitetura técnica avaliada por precisão de dados

GOVERNANÇA

Comitê de governança orçamentária semanal com análise em cascata do Burn Rate

Critérios de DoD vinculados a metas de precisão de IA (mínimo de 85%)

📁 5. GESTÃO DE DADOS, ANALYTICS E DECISÕES DATA-DRIVEN

CASE #20 DATA-DRIVEN DECISION MAKING

Magazine Luiza / CI&T

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de dados e métricas para orientar as decisões do gerente de projetos.

SITUAÇÃO

Decisões tomadas com base em percepções subjetivas dos líderes.

TAREFA

Orientar as decisões do projeto através de dados e métricas reais.

AÇÃO

Implementação de dashboards de Flow Metrics (Throughput, Lead Time).

RESULTADO

Decisões assertivas e melhoria de 25% na acuracidade dos prazos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Melhoria de 25% na acuracidade de previsões de prazos

Redução no retrabalho por decisões equivocadas

ARQUITETURA TÉCNICA

Extração de dados via APIs das ferramentas de desenvolvimento

Infraestrutura de business intelligence para gerência de engenharia

GOVERNANÇA

Dashboards automatizados baseados em Flow Metrics (Throughput, Lead Time, Cycle Time)

Uso formal de métricas de fluxo em decisões de escopo

CONTEXTO (DESAFIO)

Transformar métricas de produtividade em insights que orientam a direção do projeto.

SITUAÇÃO

Sucesso percebido subjetivamente sem dados para orientar investimentos.

TAREFA

Transformar métricas técnicas em insights de negócio para direção.

AÇÃO

Uso de Python/Pandas para correlação entre velocidade e satisfação.

RESULTADO

Investimentos baseados em ROI e aumento de 15% na eficiência operacional.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Aumento de 15% na eficiência das operações

Garantia de ROI positivo em investimentos priorizados

ARQUITETURA TÉCNICA

Ambiente local de script Python com Pandas estruturado para consolidação de logs

Data pipeline simples para cruzamento de bases

GOVERNANÇA

Auditoria analítica e estatística periódica do rendimento técnico

Modelagem de dados convertendo dados de engenharia em métricas de valor de negócio

CONTEXTO (DESAFIO)

Avaliação sistemática do ROI das mudanças implementadas.

SITUAÇÃO

Incerteza se mudanças de ritos trouxeram benefícios reais ou apenas rotina.

TAREFA

Realizar avaliação sistemática do ROI das mudanças implementadas.

AÇÃO

Monitoramento de Lead Time e custo por entrega por seis meses.

RESULTADO

Redução de 20% nos custos operacionais, validando a nova estrutura.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução sustentada de 20% nos custos operacionais internos

ARQUITETURA TÉCNICA

Base histórica unificada de performance operacional

Dashboards integrados de acompanhamento a longo prazo

GOVERNANÇA

Acompanhamento e monitoramento rigoroso de Lead Time por 6 meses consecutivos

Mecanismo periódico de validação de ROI pós-transformação

6. PROJETOS DE ENGENHARIA DE DADOS, BACKEND E IA

CASE #23

LIDERANÇA TÉCNICA EM PROJETOS DE TI

Kroton-Cogna / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Coordenação entre requisitos de negócio e viabilidade técnica da arquitetura.

SITUAÇÃO

Distanciamento entre pedidos de negócio e viabilidade técnica.

TAREFA

Coordenar requisitos de negócio com a viabilidade da arquitetura.

AÇÃO

Atuação como ponte técnica e participação no desenho de escalabilidade.

RESULTADO

Sistema robusto sem problemas de performance após aumento de 300% de usuários.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Disponibilidade total do sistema durante picos de demanda

Suporte a um crescimento repentino de 300% na base de usuários ativos

ARQUITETURA TÉCNICA

Arquitetura escalável de alta disponibilidade backend

Padrões de design de sistemas preparados para carga massiva

GOVERNANÇA

Intermediação formal de arquitetura entre áreas de Negócio e Engenharia

Validação técnica de escopo antes do início dos desenvolvimentos

CONTEXTO (DESAFIO)

Coordenação de projetos complexos de integração de sistemas de gestão e BI.

SITUAÇÃO

Integração entre SAP e BI gerando dados inconsistentes.

TAREFA

Coordenar a integração complexa de sistemas de gestão e BI.

AÇÃO

Liderança de squad de limpeza de dados e reestruturação de ETL.

RESULTADO

Dados 100% confiáveis e economia recorrente de R\$ 1,2 milhão/ano.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Economia recorrente auditada de R\$ 1,2 milhão por ano

Atingimento de 100% de confiabilidade nos dados analíticos

ARQUITETURA TÉCNICA

Pipelines de ETL (Extract, Transform, Load)

Arquitetura integrada de sistemas corporativos SAP e Business Intelligence

GOVERNANÇA

Criação de squad dedicada para saneamento e qualidade de dados

Homologação e ritos rígidos de validação de integridade de bases de dados

CONTEXTO (DESAFIO)

Liderança de iniciativas pioneiras no uso de IA para otimização de processos de negócio.

SITUAÇÃO

Necessidade de automatizar análise de milhares de documentos contábeis.

TAREFA

Liderar o uso de IA para otimização de processos de negócio.

AÇÃO

Uso de IA Generativa e NLP para ferramenta de classificação automática.

RESULTADO

Redução de 70% no tempo de análise e aumento na precisão da auditoria.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 70% no tempo de ciclo operacional de análise

Incremento mensurável na precisão dos relatórios de auditoria

ARQUITETURA TÉCNICA

Modelos de Processamento de Linguagem Natural (NLP)

Uso integrado de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) corporativos e IA Generativa

GOVERNANÇA

Políticas internas de validação de respostas geradas por IA

Controles de segurança da informação aplicados a dados confidenciais na nuvem

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de infraestruturas que permitem o consumo democrático e seguro de dados.

SITUAÇÃO

Times de dados gastando muito tempo configurando ambientes.

TAREFA

Permitir o consumo democrático e seguro de dados na corporação.

AÇÃO

Criação de 'Golden Paths' e plataforma de dados como serviço.

RESULTADO

Maior agilidade para os squads e governança centralizada com LGPD.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução drástica no tempo de setup de times de analytics (Time-to-Value)

Conformidade integral com normas legais de dados

ARQUITETURA TÉCNICA

Plataforma de Dados como Serviço (Data Platform as a Service)

Implementação de caminhos padronizados de infraestrutura (Golden Paths)

GOVERNANÇA

Políticas automatizadas de conformidade com a LGPD

Governança centralizada de acessos e mascaramento de dados sensíveis

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantir a flexibilidade e mitigar riscos na integração de alta complexidade entre o ecossistema Adobe Experience Manager (AEM) e modelos de inteligência artificial.

SITUAÇÃO

Risco elevado de integração em arquiteturas complexas e dependência mútua entre as camadas de CMS e IA para personalização preditiva de conteúdo.

TAREFA

Estruturar uma abordagem de entrega flexível e incremental que evite gargalos e garanta a validação precoce do sistema integrado.

AÇÃO

Aplicação de fatiamento vertical de escopo (Vertical Slicing) via frameworks de escala (SAFe/Scrum de Scrums), isolando IA e CMS com microsserviços desacoplados (APIs) e liderando a entrega de um MVP focado em uma única jornada na Sprint 3.

RESULTADO

Mitigação do risco de integração em 40% no início do cronograma, viabilização de releases incrementais a cada duas semanas e manutenção do lead time de entrega dentro da meta estabelecida.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Mitigação de 40% nos riscos de integração no início do cronograma

Garantia de deploys incrementais e contínuos a cada duas semanas

ARQUITETURA TÉCNICA

Integração de CMS Adobe Experience Manager (AEM) com modelos de IA preditiva

Desenho de microsserviços desacoplados baseados em APIs

GOVERNANÇA

Estratégia de fatiamento vertical de escopo (Vertical Slicing)

Gestão de sincronia técnica via frameworks ágeis escalados (SAFe e Scrum de Scrums)

CASE #28

AUTOMAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS

Natura / Accenture

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de tecnologia para automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência.

SITUAÇÃO

Processos de deploy manuais e propensos a erro.

TAREFA

Aumentar a eficiência através da automação de tarefas repetitivas.

AÇÃO

Implementação de pipelines de CI/CD e monitoramento de performance em tempo real.

RESULTADO

Aumento na frequência de deploys e redução de 40% nos erros humanos.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução de 40% na incidência de falhas causadas por erro humano

Aumento na velocidade de colocação de pacotes de código em produção

ARQUITETURA TÉCNICA

Pipelines automatizados de CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)

Sistemas de telemetria e monitoramento de performance em tempo real

GOVERNANÇA

Automatização integral de aprovações de deploy e esteiras de qualidade

Políticas e auditoria automatizada de lançamentos em produção

CONTEXTO (DESAFIO)

Liderança de projetos experimentais que buscam novas soluções tecnológicas.

SITUAÇÃO

Necessidade de coletar dados de mercado em tempo real automaticamente.

TAREFA

Liderar projetos experimentais em busca de novas soluções.

AÇÃO

Desenvolvimento de web scrapers avançados em Python.

RESULTADO

Criação de novo serviço de inteligência e novas fontes de receita.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Desenvolvimento de novas ofertas e canais de monetização

Geração de inteligência de mercado autônoma

ARQUITETURA TÉCNICA

Mecanismos avançados de web scraping (Selenium / BeautifulSoup)

Bases de dados relacionais ou NoSQL para armazenamento em massa de dados capturados

GOVERNANÇA

Metodologia ágil aplicada a projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

Políticas internas éticas e de compliance para varredura e raspagem de dados web

CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de scripts e ferramentas customizadas para ganho de produtividade em TI.

SITUAÇÃO

Processo de criação de mosaicos de imagens manual e demorado.

TAREFA

Ganhar produtividade através de scripts e ferramentas customizadas.

AÇÃO

Desenvolvimento de classe Python para processamento de massa (Pillow/Lanczos).

RESULTADO

Entrega de mosaicos em minutos em vez de dias de trabalho.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Redução drástica do tempo de execução operacional de dias para minutos

Ganhos exponenciais de produtividade interna

ARQUITETURA TÉCNICA

Código estruturado e automatizado em linguagem Python

Uso de bibliotecas especialistas para tratamento gráfico massivo (Pillow / algoritmos Lanczos)

GOVERNANÇA

Desenvolvimento de classes internas utilitárias e reaproveitáveis (mlgtt_utils)

Versionamento estruturado de scripts de automação local

8. SEGURANÇA, COMPLIANCE E STAKEHOLDERS

CASE #31

SEGURANÇA E COMPLIANCE DE DADOS

PwC Brasil

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantia de que os projetos estejam em conformidade com leis e padrões (LGPD/ISO).

SITUAÇÃO

Projeto de IA lidando com dados sensíveis de clientes.

TAREFA

Garantir conformidade com leis e padrões de segurança de dados.

AÇÃO

Blueprint de MLOps focado em segurança, anonimização e auditorias.

RESULTADO

Aprovação total pelo compliance e risco, sem incidentes de segurança.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Zero incidentes de segurança ou vazamentos registrados

Aprovação regulatória integral e sem apontamentos

ARQUITETURA TÉCNICA

Blueprint de arquitetura MLOps focado em segurança avançada

Sistemas e rotinas criptográficas e de anonimização automática de dados sensíveis

GOVERNANÇA

Alinhamento estrutural com as regras legais da LGPD e normas internacionais ISO

Rotinas periódicas e automatizadas de auditoria interna de dados e acessos

CONTEXTO (DESAFIO)

Engajamento e alinhamento de expectativas de todas as partes interessadas.

SITUAÇÃO

Conflito de prioridades entre Auditoria e Tecnologia.

TAREFA

Engajar e alinhar as expectativas de todos os stakeholders.

AÇÃO

Workshops de metas conjuntos e comunicação segmentada por nível.

RESULTADO

Resolução de impasses políticos e apoio total da diretoria para a fase final.

MÉTRICAS DE NEGÓCIO

Desbloqueio de impasses políticos e organizacionais entre diretorias

Apoio e patrocínio unânime para a entrega de fases de alta relevância

ARQUITETURA TÉCNICA

Matriz de influência e interesse de stakeholders

Canais de comunicação e alinhamento remoto segmentados

GOVERNANÇA

Workshops de alinhamento e facilitação de metas conjuntas

Planos táticos de comunicação segmentada por nível hierárquico
